

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2019

Localidad de
San Cristóbal

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	1
2. INTRODUCCIÓN	3
3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL	4
3.1 EJECUCIÓN POR METAS	10
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	14
5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL	18
5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	31
6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	43
7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019	45

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

La Alcaldía Local de San Cristóbal, realizó durante 2019 un esfuerzo por acercarse a la comunidad, e implementar acciones que desde el Plan de Desarrollo Local permitieran solucionar las necesidades apremiantes y disponer de un equipo de trabajo por y para el territorio local y sus habitantes.

En este sentido, a través de la territorialización, de la ubicación de los bienes y servicios a los que acceden las personas, y a partir de una reprogramación de los mismos, se logró una cobertura mayor a la de otras localidades en los diferentes proyectos de inversión y de gestión que se ejecutaron desde la Alcaldía Local, y se siguió fortaleciendo la anualidad en el presupuesto local.

Los derechos de los adultos mayores en la localidad, fueron representados a través de la amplia cobertura en proyectos como el subsidio económico tipo C; la agilidad e individualización de ingresos y egresos para el reemplazo de beneficiarios y entrega efectiva del beneficio, fueron una constante durante todo el año.

De igual manera, con los niños y niñas de la localidad, así como con sus familias, las acciones realizadas con el proyecto de buen trato, generaron un acercamiento, cobertura e impacto directo sobre su ejercicio cotidiano, y las relaciones interpersonales y familiares en los distintos barrios y UPZ de la localidad.

La celeridad en los procesos de contratación, otorgaron al territorio local, una malla vial y unos parques renovados en menor tiempo; para el mes de agosto ya se habían iniciado las intervenciones, lo que permitió de igual forma acceder a nuevos recursos de la ciudad, para seguir invirtiendo en los espacios públicos de San Cristóbal.

El liderazgo ambiental de la localidad es un hecho, el cumplimiento de acciones populares, y la implementación pionera a nivel distrital de las obras del Centro de Restauración Ambiental de los Cerros Orientales CERESA, en coordinación con las entidades del nivel local y distrital, presenta avances muy importantes tanto para la localidad como para la ciudad.

Adicionalmente, se está forjando una nueva cultura local; la implementación de los gestores de convivencia en los barrios, al lado de la gente, ha impactado la convivencia real y la participación de la ciudadanía en las decisiones desde los microterritorios, mejorando los ejercicios de solución de conflictos, apropiación del territorio y el trabajo comunitario.

El impulso de toda una comunidad por mejorar sus condiciones, se ha visto reflejado en la interlocución e interacción de las diferentes entidades locales y distritales, que han permitido a la administración local, llevar a cabo las acciones competentes para la prestación de servicios y bienes de calidad en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



los diferentes ámbitos, tanto en la infraestructura local, como en las acciones sociales implementadas en los diferentes barrios.

Seguimos avanzando en las tareas de inspección y vigilancia en los temas relacionados con la norma urbanística, los establecimientos de comercio y el espacio público. Las acciones diarias, hacen de la localidad un mejor sitio para todos los que habitan, cohabitan y conviven en el territorio.

San Cristóbal seguirá siendo un territorio ávido de acciones de mejora; la motivación de la administración local ha sido y es, optimizar los recursos públicos locales, de tal forma que los derechos de los habitantes de la localidad sean fortalecidos, y el territorio esté en condiciones óptimas para la convivencia. Esperamos seguir contando con la comunidad para seguir avanzando.

JUAN CARLOS SOSA

Alcalde Local de San Cristóbal (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar a conocer la gestión realizada a través del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, el documento que se presenta a continuación, realiza un informe tanto general como detallado de las acciones desarrolladas durante la vigencia 2019, en marco del Plan de Desarrollo Local Bogotá Mejor Para Todos – San Cristóbal Mejor Para Todos Una Localidad Sana, Feliz y en Paz.

En este sentido, se inicia con un balance general del avance acumulado del Plan de Desarrollo Local, presentando el progreso frente a la contratación de los bienes y servicios y su ejecución real. En seguida, se presenta desglosado dicho avance, de acuerdo con los programas, proyectos y metas del Plan, y por supuesto, la ejecución presupuestal correspondiente.

A continuación, y con el fin de evidenciar los logros de las metas trazadas en la administración local, y en consonancia con las necesidades identificadas en los recorridos de Gobierno Todo Terreno, se presenta para cada uno de los pilares y ejes transversales del plan de desarrollo, las acciones desarrolladas en torno a los proyectos de inversión priorizados durante la vigencia.

No podía faltar, el esfuerzo de la administración local y de la Secretaría Distrital de Planeación, por territorializar la inversión que se realizó durante la vigencia; de esta forma, se encuentra en el documento, un apartado específico al respecto.

Finalmente, y atendiendo a las acciones realizadas en el territorio frente a los diferentes ámbitos del Plan de Desarrollo, se presentan las dificultades, soluciones y recomendaciones que desde el ejercicio local, se realizan para finalizar el Plan de Desarrollo Local. Se anexa igualmente, el anexo contractual para la vigencia.

Esperamos que el presente informe contribuya al logro de los principios de transparencia y buen gobierno que tiene la Administración Distrital.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**


3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL

AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de San Cristóbal a 31 de diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado del PDL del 78.2%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el plan presentó un avance del 57,9%, lo que indica que el 74,1% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

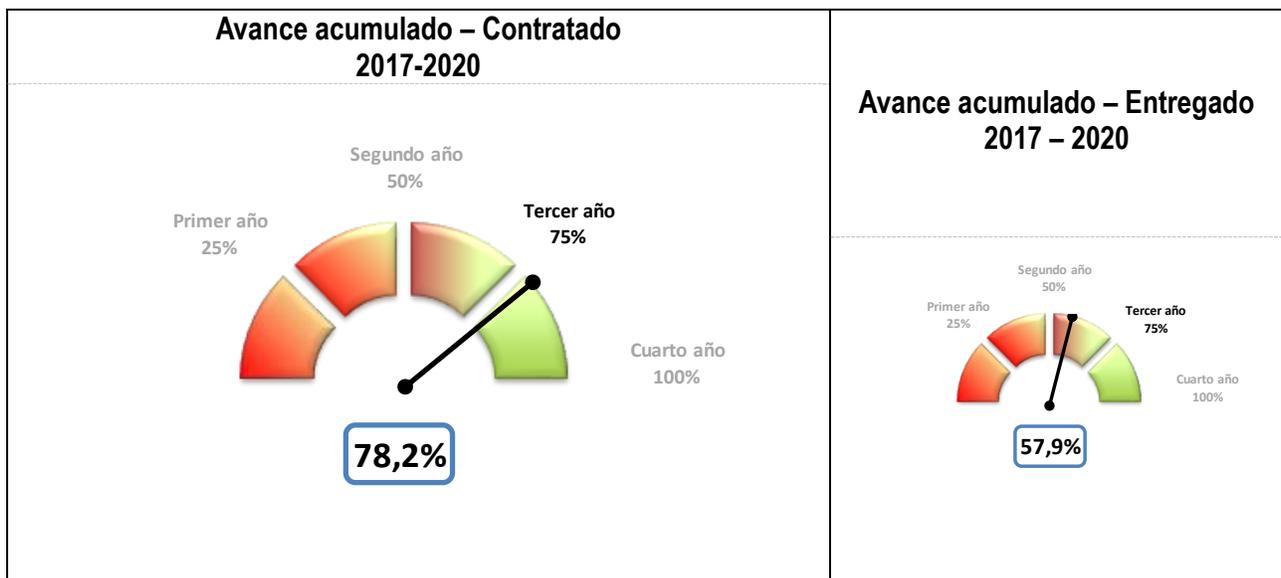


Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2018 con un 26,1% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados también se presenta en la vigencia 2018 con un incremento del 38,8%.


Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

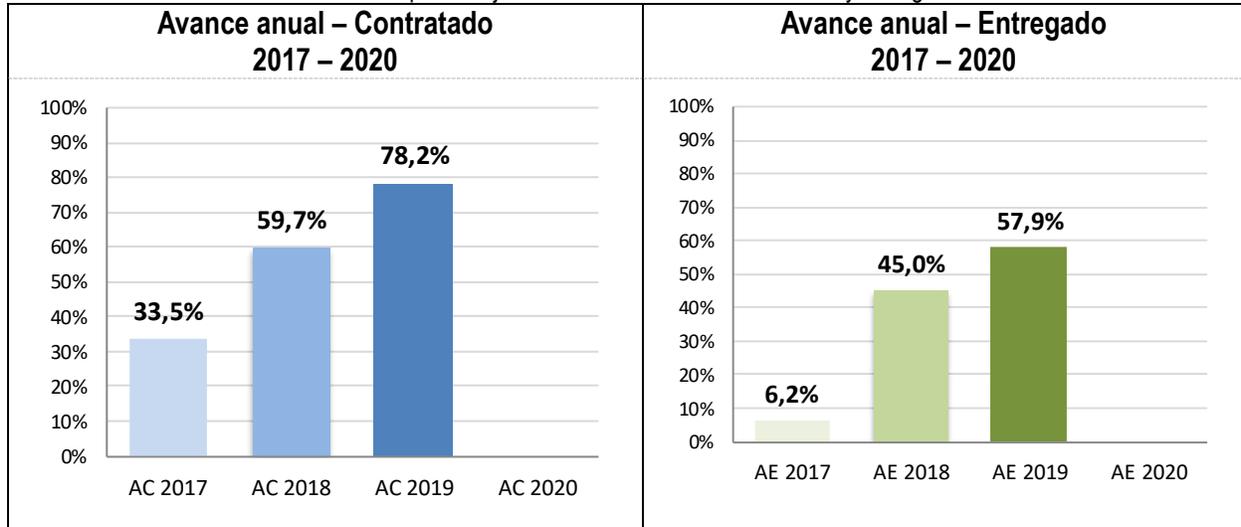

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de San Cristóbal ocupa el décimo cuarto lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto décimo.

Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.

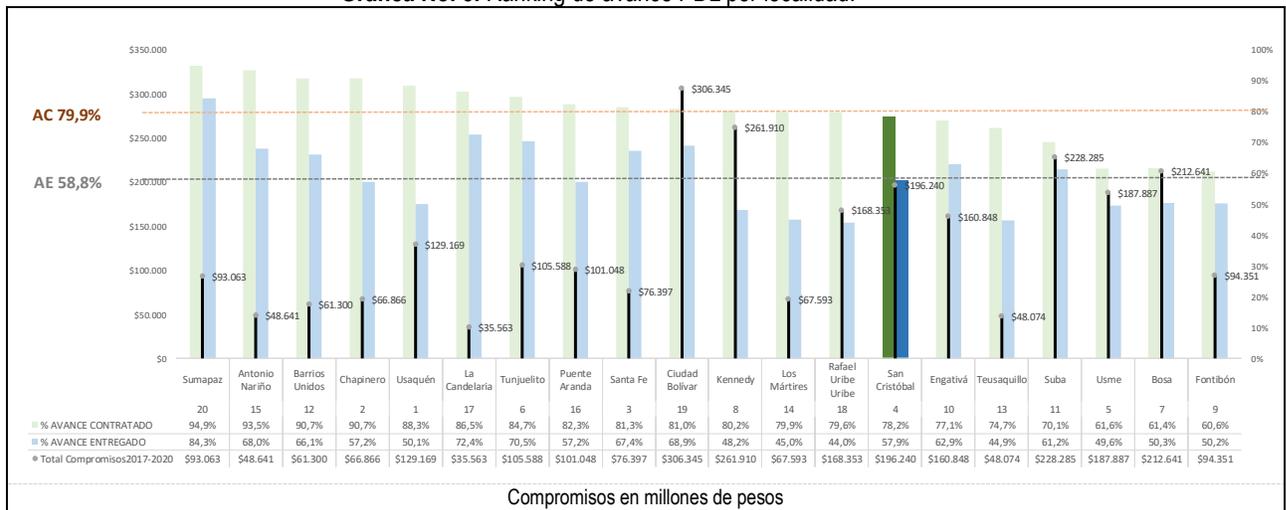

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el pilar Democracia urbana (90.0%) que incluye los temas relacionados con construcción y mantenimiento de malla vial y espacio público, construcción y mejoramiento de parques. En segundo lugar, está el eje Sostenibilidad ambiental (78.2%), que incluye los temas relacionados con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo y coberturas verdes, restauración ecológica y arborización. Y en tercer lugar, el Pilar Igualdad de calidad de vida (76.4%) que incluye los temas relacionados con la atención integral de niños y niñas, atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, personas en condición de discapacidad, dotación de IED y Acciones para la promoción de la cultura, la recreación y el deporte. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al eje Sostenibilidad ambiental (97.3%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.

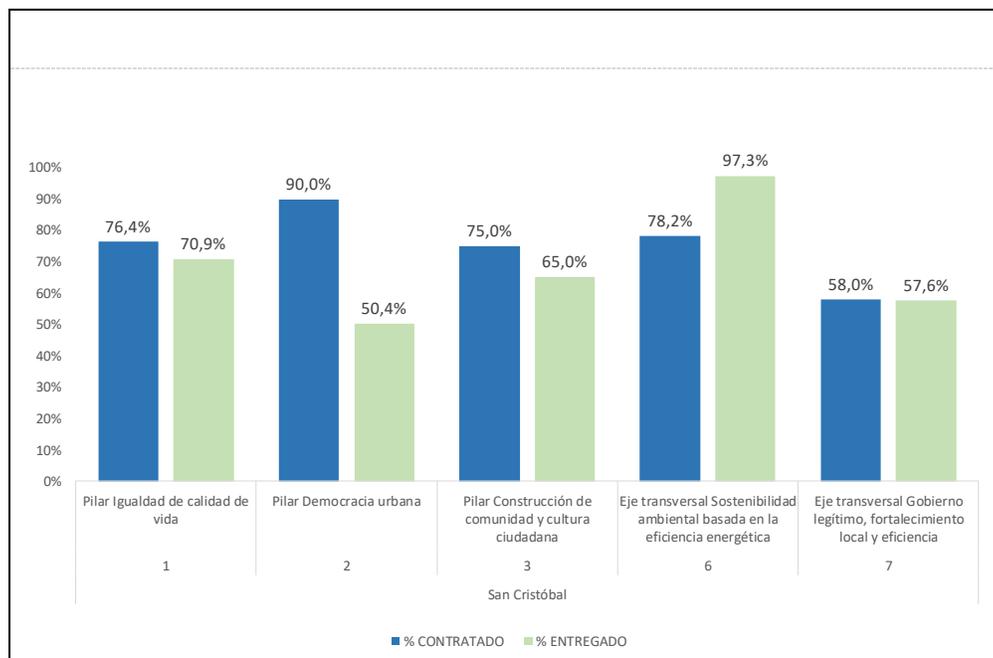

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de San Cristóbal cuenta con 11 programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Inclusión educativa para la ciudad con 100%, Mejor movilidad para todos (91.2%) y Espacio público derecho de todos (86.5%). El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con \$31.794 millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.

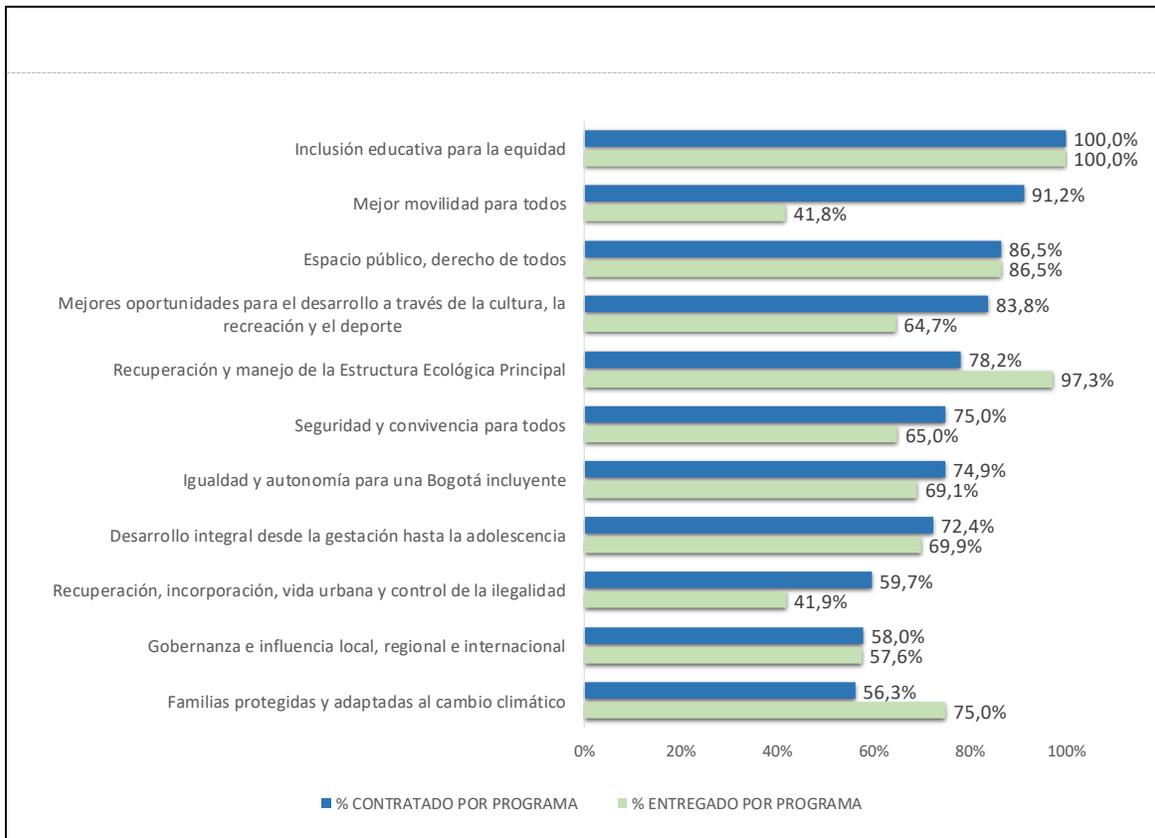

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de San Cristóbal, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 14 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1492-00	Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal	72,4%	\$1.083	\$1.055	\$1.089	\$3.227
3-3-1-15-01-03-1502-00	Superando las barreras de la discapacidad en San Cristóbal	73,8%	-	\$1.944	\$972	\$2.916
3-3-1-15-01-03-1509-00	Personas mayores protegidas en San Cristóbal	75,0%	\$7.209	\$12.261	\$2.181	\$21.651
3-3-1-15-01-04-1579-00	San Cristóbal preparada para el riesgo	56,3%	\$117	\$6.832	\$3.414	\$10.363
3-3-1-15-01-07-1486-00	En San Cristóbal se contribuye a una mejor educación	100,0%	\$513	\$603	\$237	\$1.353
3-3-1-15-01-11-1554-00	Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal	83,8%	\$1.424	\$1.709	\$2.464	\$5.598
3-3-1-15-02-15-1581-00	San Cristóbal cumple y respeta las normas	59,7%	\$74	\$377	\$430	\$882
3-3-1-15-02-17-1510-00	Parques de ensueño en San Cristóbal	86,5%	\$5.545	\$6.504	\$7.571	\$19.621
3-3-1-15-02-18-1557-00	Mejores vías y espacio publico para todos en San Cristóbal	91,2%	\$28.286	\$26.963	\$31.794	\$87.043
3-3-1-15-03-19-1555-00	Mejor seguridad y convivencia para todos	75,0%	\$2.773	\$2.638	\$2.336	\$7.747
3-3-1-15-06-38-1534-00	San Cristóbal ambientalmente sostenible	78,2%	\$1.230	\$1.400	\$791	\$3.420
3-3-1-15-07-45-1531-00	Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional	78,1%	\$5.808	\$8.642	\$8.597	\$23.047
3-3-1-15-07-45-1578-00	Participación para el bien común en San Cristóbal	99,6%	\$2.338	\$2.487	\$2.217	\$7.043
3-3-1-15-07-45-1580-00	Nueva sede para un mejor servicio al ciudadano	-	\$624	\$83	\$1.623	\$2.330

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de San Cristóbal, existe un total de 30 metas en el PDL. Del total de metas, 3 presentan un nivel de avance contratado bajo, 4 un nivel medio y 23 un nivel alto. En este sentido, el 86.7% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado.

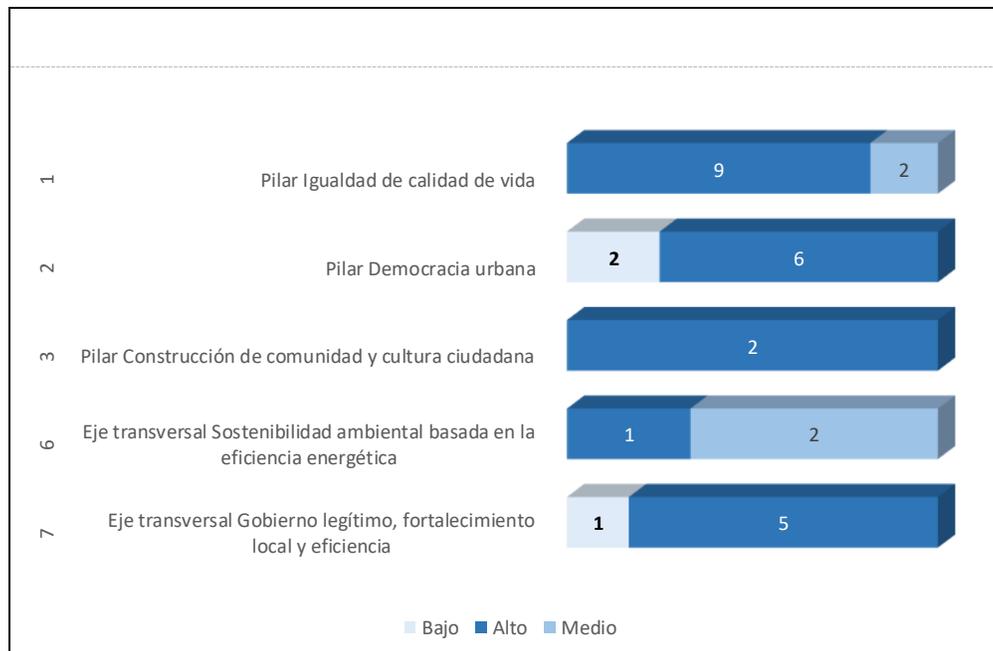

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3.1 EJECUCIÓN POR METAS

EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de San Cristóbal, en 2019 se programaron 29 metas, de las cuales, 24 (82.7%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019.

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Adecuar 4 jardines infantiles	1,0	1,0	100,0%
Dotar 589 jardines infantiles	584,0	511,0	87,5%
Vincular 2000 personas en acciones de promoción del buen trato infantil	500,0	1.000,0	200,0%
Beneficiar 4950 personas con subsidio tipo C por año	4.950,0	4.950,0	100,0%
Beneficiar 1600 personas en condición de discapacidad con ayudas técnicas no POS	550,0	390,0	70,9%
Realizar 1 estrategia integral de promoción y prevención frente al riesgo natural y antrópico	1,0	1,0	100,0%
Dotar 33 IED con material pedagógico	8,0	39,0	487,5%
Realizar 8 eventos artísticos y culturales	40,0	3,0	7,5%
Vincular 600 personas a procesos de formación artística y cultural	50,0	400,0	800,0%
Realizar 12 eventos de recreación y deporte	2,0	3,0	150,0%
Vincular 800 personas a procesos de formación deportiva	200,0	1.172,0	586,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pilar 2. Democracia urbana.

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Gestionar la presentación de 300 demandas de titulación predial	1,0	186,0	18600,0%
Realizar 1 estudio preliminar para la regularización urbanística (levantamientos topográficos y análisis) a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en la localidad	4,0	-	-
Construir 8 parques vecinales y/o de bolsillo	3,0	-	-
Intervenir 65 parques vecinales y/o de bolsillo	10,0	33,0	330,0%
Construir 5,5 Km/carril de malla vial loca	1,5	8,1	540,0%
Mantener 45 Km/carril de malla vial loca	18,0	5,8	32,1%
Construir 24000 m ² de espacio público local	6.000,0	4.350,0	72,5%
Intervenir 16 puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua	4,0	15,0	375,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 dotaciones para seguridad	1,0	1,0	100,0%
Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	500,0	500,0	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Sembrar 2800 árboles nativos para mejorar las condiciones ambientales de la localidad	700,0	-	-
Intervenir 12 has de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	3,0	10,0	333,3%
Intervenir 4000 m ² de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	1.000,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Implementar 1 estrategia contratación de servicios profesionales, y la adquisición de bienes y servicios para garantizar la gobernabilidad local	1,0	1,0	100,0%
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	1,0	1,0	100,0%
Fortalecer 100 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas para la participación	15,0	65,0	433,3%
Vincular 800 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social	200,0	300,0	150,0%
Adecuar 1 sede de gobierno local	1,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.

Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial local construido	Suma	6	9	-	156,4%	-
		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	45	38	12	85,0%	27,4%
		m2 de espacio público construidos	Suma	24.000	34.200	34.935	142,5%	145,6%
		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua	Suma	16	15	2	93,8%	12,5%
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo construidos	Suma	8	-	-	-	-
		Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	65	86	65	132,3%	100,0%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	2	75,0%	50,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2.000	1.500	4.127	75,0%	206,4%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Demandas de titulación predial presentadas	Suma	300	286	201	95,3%	67,0%
		Estudios preliminares para la regularización urbanística	Suma	1	-	-	-	-
5	Atención a población	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	4.950	3.713	3.692	75,0%	74,6%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Constante	1	1	1	75,0%	75,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	1.600	1.180	345	73,8%	21,6%
		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2.000	3.000	3.200	150,0%	160,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Suma	33	70	63	212,1%	190,9%
		Jardines infantiles adecuados	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Jardines infantiles dotados	Constante	589	311	279	52,8%	47,3%
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	600	988	808	164,7%	134,7%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	800	2.372	2.200	296,5%	275,0%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	8	6	4	75,0%	50,0%
			Suma	12	9	5	75,0%	41,7%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	2.800	1.578	3.485	56,4%	124,5%
		Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de	Suma	12	32	23	266,7%	190,8%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros	Suma	4.000	2.473	3.735	61,8%	93,4%
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	Suma	100	191	195	191,0%	195,0%
		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control	Suma	800	700	294	87,5%	36,8%
15	Proyecto estratégico	Estrategias integrales para la prevención del riesgo natural y	Constante	1	1	1	56,3%	75,0%
16	Proyecto estratégico (Sede)	Sede administrativa local adecuada	Suma	1	-	-	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de San Cristóbal ha comprometido un presupuesto acumulado de \$196.240 millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 2019 con un valor de \$65.716 millones (100%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2019, los cuales fueron por valor de \$25.049 millones (38.1%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar.

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL

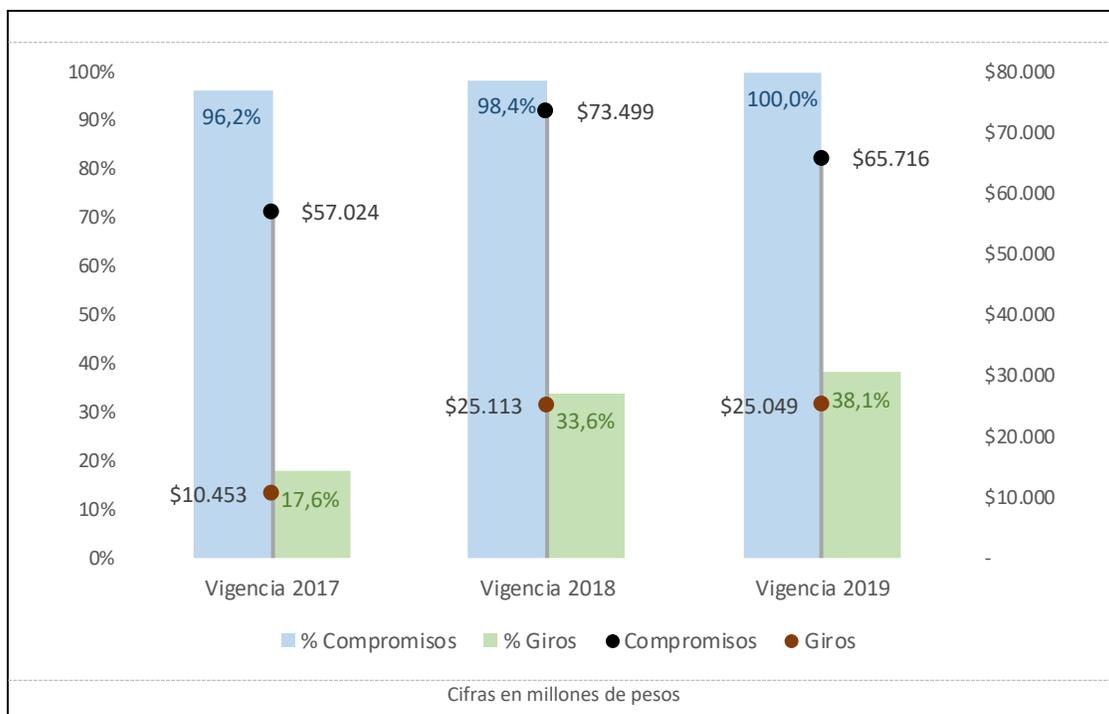

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad \$87.043 millones que representa el 44.4% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$32.420 millones (16.5%) y Cultura, recreación y deporte \$25.219 millones (12.9%).

Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$28.286	\$26.963	\$31.794	\$87.043	44,4%
Sector Gobierno	\$8.770	\$11.213	\$12.438	\$32.420	16,5%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$6.970	\$8.213	\$10.035	\$25.219	12,9%
Sector Integración social	\$8.292	\$13.316	\$3.270	\$24.878	12,7%
Sector Ambiente	\$1.346	\$8.232	\$4.205	\$13.783	7,0%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$2.773	\$2.638	\$2.336	\$7.747	3,9%
Sector Salud	-	\$1.944	\$972	\$2.916	1,5%
Sector Educación	\$513	\$603	\$237	\$1.353	0,7%
Sector Hábitat	\$74	\$377	\$430	\$882	0,4%
TOTALES	\$57.024	\$73.499	\$65.716	\$196.240	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2019

EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019
Anexo 1 (85%)	82,0%	88,1%	82,0%	78,2%	80,6%	82,6%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	13,0%	12,8%	13,0%	16,7%	1,6%	3,4%
Gestión pública local	10,0%	8,4%	10,0%	8,1%	8,3%	8,3%
Inspección, vigilancia y control - IVC	4,0%	2,0%	4,0%	4,2%	5,2%	5,8%
Malla vial, espacio público y peatonal	40,0%	50,2%	40,1%	36,7%	50,5%	49,6%
Parques	10,0%	9,8%	10,0%	8,9%	10,0%	11,8%
Seguridad y convivencia	5,0%	4,9%	5,0%	3,6%	5,0%	3,6%
Anexo 2 (15%)	18,0%	11,9%	18,0%	21,8%	19,4%	17,4%
Atención a población vulnerable	2,0%	-	3,5%	3,2%	5,2%	2,2%
Dotación	3,3%	2,8%	2,5%	1,7%	2,2%	1,4%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	2,2%	1,2%	2,5%	1,1%	3,3%	2,4%
Participación	5,3%	4,1%	4,1%	3,4%	3,7%	3,5%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,1%	1,3%	2,2%	1,3%	1,0%	1,5%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	2,5%	2,2%	2,1%	1,9%	2,5%	1,2%
Proyecto estratégico	1,6%	0,2%	1,0%	9,3%	1,5%	5,3%
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	5,1%	1,1%	3,0%	0,1%	3,1%	2,5%
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	5,1%	1,1%	3,0%	0,1%	3,1%	2,5%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de San Cristóbal, los mayores recursos comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$87.043 millones, “Atención a población vulnerable” con \$21.651 millones y “Parques” con \$19.621 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Proyecto estratégico” con un monto de \$10.363 millones “Participación” con \$7.043 millones, y “Atención a población vulnerable” con \$3.785 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017_2020
Anexo 1 (85%)	\$45.473	\$49.696	\$53.412	\$57.385	\$50.021	\$52.909	\$159.990
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$7.209	\$7.209	\$8.455	\$12.261	\$1.008	\$2.181	\$21.651
Gestión pública local	\$5.546	\$4.760	\$6.505	\$5.943	\$5.150	\$5.331	\$16.035
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.218	\$1.122	\$2.599	\$3.076	\$3.217	\$3.696	\$7.894
Malla vial, espacio público y peatonal	\$22.182	\$28.286	\$26.097	\$26.963	\$31.340	\$31.794	\$87.043
Parques	\$5.546	\$5.545	\$6.504	\$6.504	\$6.205	\$7.571	\$19.621
Seguridad y convivencia	\$2.773	\$2.773	\$3.252	\$2.638	\$3.102	\$2.336	\$7.747
Anexo 2 (15%)	\$9.982	\$6.704	\$11.709	\$16.031	\$12.025	\$11.184	\$33.920
Atención a población vulnerable	\$1.100	-	\$2.250	\$2.356	\$3.198	\$1.429	\$3.785
Dotación	\$1.850	\$1.596	\$1.650	\$1.246	\$1.354	\$869	\$3.711
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.200	\$693	\$1.650	\$778	\$2.061	\$1.509	\$2.981
Participación	\$2.964	\$2.338	\$2.701	\$2.487	\$2.320	\$2.217	\$7.043
Procesos de formación artística, cultural y depor	\$600	\$731	\$1.420	\$931	\$620	\$955	\$2.617
Protección y recuperación de los recursos ambie	\$1.375	\$1.230	\$1.400	\$1.400	\$1.551	\$791	\$3.420
Proyecto estratégico	\$893	\$117	\$637	\$6.832	\$920	\$3.414	\$10.363
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	\$3.000	\$624	\$2.000	\$83	\$2.000	\$1.623	\$2.330
Proyecto estratégico (Sede administrativa)	\$3.000	\$624	\$2.000	\$83	\$2.000	\$1.623	\$2.330

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Proyecto 1492. Niños y niñas sanos y felices en San Cristóbal.

El Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal ha venido beneficiando los jardines de Integración Social y los Hogares de Bienestar de ICBF con dotación pedagógica adecuada a las necesidades de los niños y niñas de la localidad, con el objetivo de contribuir a la potencialización de las dimensiones del desarrollo infantil de la primera infancia que es atendida en estos jardines.

En este sentido, durante el año 2019 se realizó la entrega de dotación pedagógica correspondiente a la Dimensión del Desarrollo Infantil Social y Comunicativa en 24 jardines Infantiles de la Secretaría de Integración Social y a 508 Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para un total de 532 Jardines beneficiados con este material pedagógico.

De igual forma, se realizó la entrega correspondiente a la Dimensión del Desarrollo Infantil Cognitiva en 23 jardines Infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social, a 470 Hogares Comunitarios de Bienestar y a 17 Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para un total de 510 Jardines, Hogares y Centros de desarrollo Infantil beneficiados con este material pedagógico.



En el marco de la estrategia institucional de Buen Trato de la Alcaldía Local de San Cristóbal, se organizaron cuatro (4) componentes a los cuales para su realización se diseñaron 12 acciones; café



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

de mundo, círculos de la palabra, performance, cine foros, dilemas morales y éticos, cartografías sociales (cuerpo), foto galerías, seminarios de formación ciudadana, ferias de la sexualidad, familias fuertes (23 colegios vinculados), escucha y orientación, encuentros comunitarios (Barrios); de cada una de estas acciones, se hicieron replicas para sumar en total 131 acciones y una cobertura de 3.200 personas entre 2018-2019.

De igual manera, se apoyaron acciones de la alcaldía en el territorio y a otras instituciones distritales con incidencia local. Se realizaron acciones de Buen trato con funcionarios de la Alcaldía Local a las cuales se vincularon 132 servidores públicos. Se desarrollan las acciones en cada una de las UPZs, contando con el equipo profesional para lograrlo.

La estrategia de buen trato permitió realizar cuatro intenciones institucionales; caracterizar las diferentes manifestaciones de violencias en el territorio local, fortalecimiento a las familias afectadas por violencias y consumo de SPA, promoción de la cultura del buen trato y realización de movilizaciones sociales en contra de las violencias en la localidad. Cada una de estas intenciones institucionales presentaron resultados altamente positivos, permitiendo construir un esquema conceptual alrededor de las violencias en san Cristóbal.



Por otra parte, y en el marco de la adecuación de jardines, se remodeló el jardín Ositos Cariñositos ubicado en el barrio San Isidro, el cual consistió en cambio de cubierta, remodelación de fachada, cambio de ventanería, adecuación de baños, instalación de pisos en granulo de caucho, juegos infantiles, instalación de cielos rasos, instalaciones eléctricas, adecuación de zonas verdes, mantenimiento cerramiento, instalación de red detección de humo, y pintura en general del jardín.



Proyecto 1509. Personas Mayores protegidas en San Cristóbal.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Se entregaron apoyos económicos a 4922 personas mayores vulnerables de la localidad; así mismo se beneficiaron 4302 personas mayores con talleres de desarrollo humano y más de dos mil personas disfrutaron de la celebración del mes de la persona mayor.

De igual forma, se logró después de varios años, aumentar el monto que reciben los adultos mayores por concepto del subsidio económico tipo C, de tal forma que a partir de septiembre de 2019 los adultos mayores de la localidad han visto el incremento de este beneficio.

Proyecto 1502. Superando las barreras de la discapacidad en San Cristóbal.

Se desarrollaron acciones importantes con la finalidad de fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad y sus cuidadores, así como aportar a la calidad de vida de este grupo poblacional, tales como:

- Evaluación de las condiciones de sociodemográficas y de salud de la población con discapacidad de la localidad.
- Reconocimiento y fortalecimiento de líderes comunitarios de población con discapacidad.
- Participación activa durante toda la ejecución del proyecto de veeduría comunitaria.
- Fuerte divulgación de proyecto a nivel local a través de canales de comunicación del Fondo de Desarrollo local y medios locales (Radio y canal de televisión), y propiedad horizontal.
- Acompañamiento desde la Alcaldía local al proceso de fabricación de los dispositivos de asistencia personal – ayudas técnicas, verificando que los términos de referencia se cumplan en cuanto a materiales, medidas y calidad.
- Por primera vez, se entregan dispositivos de asistencia personal de alta tecnología tales como Tablets, sistema Hand Bike y sillas eléctricas.
- Caracterización de cuidadores a nivel local.
- Jornadas de entrega de dispositivos, así como talleres de entrenamiento.
- Proceso de georreferenciación de entrega de los dispositivos, abarcando las 5 UPZ a nivel local. Entrega de 2233 Dispositivos de Asistencia personal entre los que se encuentran sillas de rueda, camas hospitalarias, kit de invidencia, kit cognitivo, calzado ortopédico, colchón y cojín antiescaras.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Proyecto 1579. San Cristóbal preparada para el riesgo.

Durante la vigencia 2019, la continuidad del equipo de gestores de ambiente y riesgo permitió dar respuesta inmediata de carácter operativo en campo a situaciones de riesgo que se presentan de manera aislada o imprevista en la localidad, realizando así acciones de reducción de riesgo eficientes y oportunas, entre estas, apoyo en adecuación de predios reasentados por parte del distrito, control de retamo espinoso y apoyo de atención de emergencias.

De manera complementaria, y atendiendo la necesidad de mejorar las condiciones fitosanitarias, se llevó a cabo la intervención del arbolado urbano de la localidad.

Adicionalmente, de la evaluación realizada por la Secretaría de Integración Social para los salones comunales de la localidad, se realizó verificación de condiciones técnicas para servir como alojamiento temporal en caso de tener que dar respuesta a una situación de emergencia. En consecuencia, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, realizó la entrega de un kit de elementos de primeros auxilios para los 47 salones comunales con este propósito.

En el marco de las acciones del Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, se llevó a cabo la primera Escuela de Riesgos de San Cristóbal, que consistió en sesiones de charlas programadas de conformidad con las competencias de cada una de las entidades participantes referentes a la gestión del riesgo y a los procesos estratégicos contemplados en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 172 de 2014, especialmente el de conocimiento y el de reducción de riesgos.

En este sentido, se desarrollaron 20 módulos en los que participaron 62 personas. Esta escuela responde a la necesidad de fortalecer a las comunidades en los procesos asociados al ambiente, al cambio climático, a los riesgos naturales y antrópicos y a los temas asociados al sector hábitat.

Con la coordinación de la Alcaldía Local y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio - IDIGER y la articulación con las entidades que conforman el Consejo Local de Gestión de Riesgo de San Cristóbal, se formuló y constituyó el documento del Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático PLGR-CC, que es el instrumento de planificación en el nivel local que define los programas, acciones, responsables y presupuestos para ejecutar los procesos de conocimiento del riesgo,



reducción del riesgo, la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación y fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y sectoriales ; en el marco de la planificación del de desarrollo de la localidad. Lo anterior, adoptado mediante el Decreto Local No. 011 DEL 12 de noviembre de 2019.

Se continuó con la programación de la mesa de reasentamientos como apoyo de la autoridad policiva para evitar ocupaciones ilegales, limpieza, cerramiento y adecuación de predios, recorridos de verificación y seguimiento del estado de los predios incluidos en el programa, respuesta oficial a juzgados donde se llevan procesos de demanda por comunidades, entre otras.

El 20 de Julio, al ser uno de los centros religiosos más importantes de la ciudad, tiene una de las mayores convocatorias durante la semana santa junto con Catedral Primada, Monserrate y Árbol de la Vida. Para el caso, Alcaldía Local realizó la coordinación del Puesto de Mando Unificado 20 de Julio durante las actividades de la semana mayor.



Proyecto 1486. En San Cristóbal se contribuye a una mejor Educación.

La administración local en aras de contribuir al desarrollo, le apostó al fortalecimiento de los procesos educativos que se han adelantado en la localidad cuarta, identificando y reconociendo todos aquellos proyectos e iniciativas especiales que se llevan a cabo en las 33 Instituciones Educativas Distritales y sus 63 sedes; con el fin de potenciar estos procesos de docentes y estudiantes, se realizó la entrega de material pedagógico acorde a las necesidades educativos y en consonancia con los lineamientos establecidos por el sector.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

De esta manera, durante el 2019 se ejecutó la compra y entrega de materiales didácticos, instrumentos musicales, trajes típicos y elementos de cocina, en 17 IED, apoyando 20 proyectos educativos especiales, y fortaleciendo dichos procesos innovadores.

De igual forma, fueron beneficiados 39 colegios con recursos tecnológicos, a través de equipos portátiles y de escritorio, que fueron entregados con el esfuerzo compartido con la Secretaría de Educación Distrital.

Para esta administración es muy grato comunicar que el proyecto 1486 en su Meta Plan culmina a la fecha con un cumplimiento de avance superior al proyectado, evidenciando cumplimiento total a lo establecido en el Plan de Desarrollo Local.



Proyecto 1554. Deporte y cultura para ser felices en San Cristóbal.

Se desarrolló la Escuela de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio – EFARTE, que cuenta con siete (7) áreas de formación: Música, Danzas, Artes Plásticas, Artes escénicas, Artes Urbanas, Audiovisuales y Literatura; con más de 200 beneficiarios, se realizó un acercamiento y sensibilización a través del proceso de formación, una salida pedagógica, una muestra final de visibilización y un reconocimiento a los participantes.

Adicionalmente, se llevó a cabo Convenio Interinstitucional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá que permitió la creación del Centro Filarmónico Local de San Cristóbal – CeFi, en el cual se formó a niños, niñas y jóvenes y se conformaron agrupaciones corales, filarmónicas y rítmicas, beneficiando más de 400 niños, niñas y adolescentes, y presentando quince (15) muestras musicales para toda la comunidad durante 2019.

Se desarrolló la Red de Eventos que incluye 22 eventos durante el 2019 con un componente adicional denominado Iniciativas Culturales que adicionaba 16 eventos más para un total de 38 eventos distribuidos en todo el territorio con una agenda conjunta para que la comunidad pudiera programarse





y participar; dicha red, fue organizada conjuntamente con las organizaciones, gestores y artistas locales.

De igual manera, junto con la iniciativa del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, se desarrolló el Circuito Cultural y Artístico que incluía una Ruta Pictórica, Encuentro Musical, Encuentro de Danzas, Festival de Teatro y Narración y un Encuentro de Barberos.

Se llevó a cabo la Semana de la Cultura, desarrollando el Festival Inter-étnico y Cultural, donde se incluían comunidades étnicas y grupos poblacionales; igualmente, se ejecutó el Festival Cultura Sin Límites, donde participaron artistas en condición de discapacidad; adicionalmente, se desarrolló el Festival de Expresiones Juveniles y Urbanas, Tertulia Literaria y Patrimonial, Festival de Teatro y Títeres, Encuentro Artístico de Personas Mayores, Exposición y Galería Artística y el Carnaval Fucha "Identidad Territorial" en el cual participaron más de 20 comparsas. La vinculación de más de 1200 artistas locales, fue determinante en este proceso.

En deporte, durante 2019 se desarrollaron las escuelas de formación deportiva vinculando más de 1000 niños y niñas de la localidad en 45 procesos en diferentes barrios y disciplinas deportivas como fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, entre otros; la cobertura fue completamente gratuita en espacios de entrenamientos, entrenadores, uniformes, y elementos de dotación, así como la capacitación a más de 100 entrenadores y entrenadoras, árbitros y dirigentes deportivos, con sus respectivos elementos técnicos para desarrollar sus módulos.

Se desarrolló la red de eventos deportivos donde se seleccionaron 10 propuestas para la entrega de dotación deportiva: balones, uniformes de diferentes deportes, tulas, mascararas de karate, pesas, aros, entre otros elementos deportivos.

De igual forma, se desarrolló un proyecto para identificar a 100 líderes deportivos los cuales fueron dotados con una sudadera representativa y la dotación para 360 niños y niñas de la localidad que asistieron a vacaciones recreativas durante el año.

Se llevaron a cabo las olimpiadas comunitarias que beneficiaron más de 2000 deportistas de toda la localidad, en campeonatos de fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, tenis de mesa, tejo, entre otros, aumentando la participación en estos proyectos deportivos los cuales garantizaron completamente gratis, juzgamiento, escenarios deportivos, balones, mallas, uniformes, elementos técnicos para cada disciplina, así como premiación sudaderas y balones simbólicos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Pilar 2. Democracia urbana.

Proyecto 1581. San Cristóbal cumple y respeta las normas.

Como parte del proceso de titulación de predios de la localidad, y teniendo todo el contexto social, jurídico, y catastral que conlleva esta situación, la alcaldía local continuó durante 2019 realizando las operaciones necesarias para cumplir con la meta esblecida en el Plan de Desarrollo; en este sentido, se recopiló la información base para la asignación e titulación, se hizo la respectiva repartición jurídica, se consolido el proceso a cada una de las solicitudes de acuerdo con los parámetros del sector hábitat, se realizó apertura de los expedientes que cumplen con requisitos, se realizaron las respectivas demandas, se atendieron a los ciudadanos que requirieron del servicio de asesoría jurídica. Se presenta a continuación, el comportamiento de los expedientes allegados durante 2019.

EXPEDIENTES 2019	
EXPEDIENTES	223
DEMANDAS PRESENTADAS PERIODO 2019	152
EXPEDIENTE EN ARCHIVO ADMINISTRATIVO SIN MATRICULA INMOBILIARIA	13
EXPEDIENTE ARCHIVADO	9
EXPEDIENTE EN RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS	49

Proyecto 1510. Parques de ensueño en San Cristóbal.

Durante 2019 se realizó la intervención de 17 parques vecinales y/o de bolsillo, logrando superar la meta del cuatrienio antes de finalizar el Plan de Desarrollo Local; Parques como el de Primero de Mayo, el Teñidero, Villa Javier, la Roca y Santa Ana, fueron renovados en su totalidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Proyecto 1557. Mejores vías y espacio público para todos en San Cristóbal.

Con recursos del 2019, se realizó la contratación para la construcción de 8.10 km/carril de malla vial, conservación de 5.71 km/carril de malla vial, construcción de 7.084 m² de espacio público; se logró la ejecución de 62 segmentos viales con una intervención de 7.59 Km-Carril y 7951.60m² de espacio público y la intervención de 14 puentes peatonales y vehiculares sobre cuerpos de agua.



En cuanto a embellecimiento de espacio público, la Alcaldía Local de San Cristóbal, realizó en 2019 las siguientes acciones específicas, para un total de 7084,3 mts² intervenidos:

Barrios Intervenidos 2019	Mts 2 intervenidos
Alcaldía local de san Cristóbal	1150
Muro Urb. Primera De mayo	1450
Parque Villa Javier	185
Parque Muro San Martin De Ioba	62
Escaleras Nueva Delhi	184
Parque Nueva Delhi	120
Parque Muro Santa Rosa	625,2
Muro La Grovana	179,1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Parque Altamira Santa Teresa	185
Parque Altamira	240
Muro Ayacucho	195
Parque y Muro Ayacucho	370
Colegio 20 De Julio	195
Parque y Muro Quindío	400
Parque El Teñidero	300
Parque Nariño Sur	200
Muro Las Mercedes	242
Muro Calle 1 c con Cra	618
Parque Buenos Aires	184
TOTAL	7084,3

En el año 2019 se realizaron intervenciones de acciones de movilidad en varias vías de la Localidad de San Cristóbal. Las acciones de movilidad se realizan de acuerdo a requerimientos y solicitudes de la comunidad; para lo cual los funcionarios de la oficina de Infraestructura realizaron los trámites antes las entidades del Distrito que tienen injerencia sobre las mismas, tales como el Instituto de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Secretaría Distrital de Movilidad y la Unidad de Mantenimiento Vial.

En consecuencia, se realizó intervención en sectores del barrio amapolas (sector CERESA), y los barrios Sosiego, Santa Ana Sur y Velodrómo.

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Proyecto 1555. Mejor seguridad y convivencia para todos.

El objetivo de este proyecto se basó en la intervención comunitaria relación con problemáticas asociadas a la seguridad y convivencia en las 5 UPZ de la Localidad de San Cristóbal, mediante acciones de prevención del delito, fortalecimiento de entornos protectores, promoción de rutas de acceso a la justicia, gestión de la participación y corresponsabilidad ciudadana para la construcción de la convivencia pacífica del territorio local.

Durante la vigencia 2019, se realizó proceso de compra de 11 vehículos tipo panel de vigilancia, los cuales permitirán fortalecer el desempeño operativo de los nueve CAI de policía ubicados en la localidad. Este proceso se encuentra en proceso de ejecución como dotación del año 2019 y su entrega se proyecta para el mes de junio del año 2020.

Se continúa de igual manera, con el proceso a través del equipo local de seguridad y convivencia, el cual realiza una labor cotidiana y cercana a las problemáticas de la comunidad; su labor se desempeña



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



desde el acompañamiento a operativos de IVC hasta planes preventivos en el transporte público, reuniones comunitarias, entornos escolares, y espacio público.

Se desarrollaron durante la vigencia acciones como, el plan parques, entornos escolares y planes mochila, plan guitarra, reuniones comunitarias, inspección, vigilana y control del espacio público, operativos de cambuches, entre otros.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.

Proyecto 1534. San Cristóbal ambientalmente sostenible.

En el marco del Convenio con la Secretaría de Ambiente y el IDIPRON, el Centro de Restauración Ambiental – CERESA – que se constituye en el segundo vivero más grande de la ciudad, con una capacidad anual cercana a 1.000 plántulas, se realizó la restauración de 10 hectáreas en áreas de ronda y nacimiento de quebradas. Se plantaron 1.162 metros cuadrados de jardinería y se plantaron o intervinieron 3205 árboles.



Con la ejecución total de los Convenios realizados, se restauraron 10.29 Ha. Sumadas las áreas totales, se logró a diciembre 31 de 2019 un total de: 22.79, superando al doble la meta del cuatrienio que era de 12 Ha.

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Proyecto 1531. Acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional.

A través de este eje, se garantizó la vinculación del personal de apoyo a la gestión a través de contratos de prestación de servicios para las diferentes áreas de acción de la alcaldía en el territorio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



En este sentido, se contó con el equipo de trabajo idóneo para la realización de las actividades propias de cada uno de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local.

Adicionalmente, y como parte de la estrategia “Juégale limpio a San Cristóbal”, para la vigencia 2019 se identificaron 264 puntos críticos y/o de acumulación por residuos sólidos en espacio público registrados durante el Gobierno Todo Terreno, como también solicitudes de la comunidad. Durante la implementación de la estrategia se han trabajado 115 puntos, ya sea mediante sensibilización y/o intervención física, en 45 barrios con un total de 2100 personas sensibilizadas, aproximadamente, en temas como manejo adecuado de residuos sólidos, código de policía, línea 110 (RCD - Escombros) y separación en la fuente.

Proyecto 1578. Participación para el bien común en San Cristóbal.

Durante el 2019, se apoyó con recursos locales la ejecución de cuarenta (40) iniciativas, presentadas por organizaciones sociales sin ánimo de lucro y Juntas de Acción Comunal de la localidad, bajo los lineamientos del modelo distrital UNO más UNO = Todos, UNA más UNA = TODAS. Fue una prioridad para la administración local, impulsar procesos que permitieran generar coordinación entre los diferentes espacios de participación, colectivos sociales y personas vinculadas a diferentes procesos, que permitiesen la consolidación de autonomía de dichos espacios, reduciendo la baja vinculación de las personas a todo tipo de procesos institucionales.



Se llevó a cabo la dotación a 74 Juntas de Acción Comunal, de elementos tecnológicos y de mobiliario, tales como computadores, impresoras, sonido, video beam, carpas, sillas, mesas, tableros, escritorios, entre otros. Se realizó igualmente, vinculación de 450 dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, a la conmemoración del día comunal, la cual se desarrolló mediante una actividad recreo-vacacional.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Así mismo, se realizó la adecuación de salones comunales, los cuales han sido utilizados para desarrollar diferentes actividades por parte de la comunidad; entre las obras desarrolladas se relaciona cambio de cubiertas, enchape, instalación de cielos falsos en pvc, pañete, cambio de ventanería, carpintería metálica, impermeabilizaciones, esgrafiado de fachadas, cambio de instalaciones hidráulicas sanitarias y eléctricas, suministro de mesones, cocinas, remodelación de baños y oficinas. Dicha adecuación fue realizada en 7 salones comunales.



Se continuó igualmente, con el proceso de formación en control social para los ciudadanos locales, de tal forma que se vincularon durante 2019 a 190 personas a los seminarios y diplomados contratados.




5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

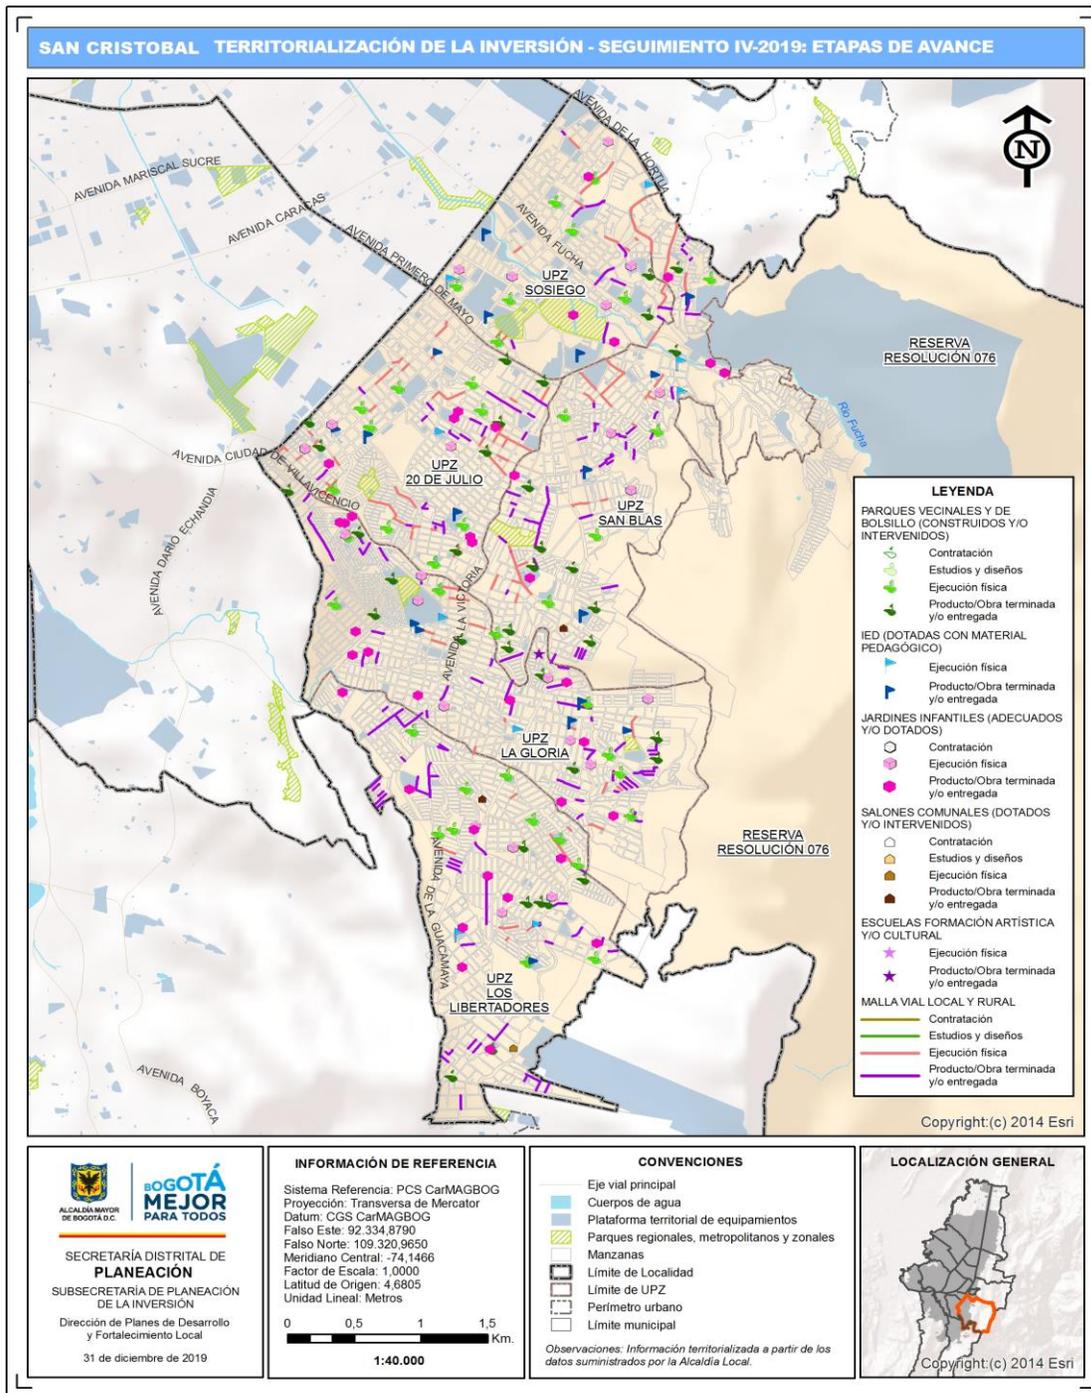

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapa avance
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	30000544	KR 3 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004908	KR 3 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004744	CL 46 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004780	CL 46 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004817	CL 46 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004860	CL 46 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004859	KR 3 B E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005054	CL 46 D S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004524	TV 3 D E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4004753	KR 3B E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4002505	CL 36 B S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4003217	CL 36 F S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4002396	CL 30 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4001530	CL 28 A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4001325	CL 27 A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	50005530	CL 36 I S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003667	CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003863	CL 40 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003734	CL 40 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001029	KR 5	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000140	KR 3	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000174	KR 3	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	30001398	CL 6 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000212	CL 6 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000241	CL 6 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000249	CL 6 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000509	KR 5 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007423	KR 5 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002781	KR 3 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002819	KR 3 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002508	CL 36 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002521	CL 36 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002116	DG 32 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002132	DG 32 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002202	DG 32 A S (CL 32 A S)	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002249	DG 32 A S (CL 32 A S)	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002281	CL 32 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002532	KR 1 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002645	KR 1 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002560	CL 36 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4005858	CL 46 G S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001071	KR 2 E S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001077	CL 24 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001594	KR 1 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001765	CL 28 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001671	KR 1 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001577	KR 1	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001931	DG 28 BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001541	KR 1 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005361	KR 4 BIS E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4005978	CL 48 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4005114	KR 7 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000024	CL 1 C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001187	KR 7 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001824	CL 35 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001568	KR 8	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001481	CL 35 BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001758	KR 8	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005409	KR 4 BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002075	CL 36 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002074	KR 5	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002148	KR 5	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002149	CL 38 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001636	CL 37 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001650	KR 9 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003363	CL 37 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002468	CLL 36B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002448	CLL 36B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002404	CRA 2	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4008401	DIAG 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007777	DIAG 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002294	DIAG 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002267	CLL 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002244	CLL 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002235	CLL 36 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007234	CLL 38 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007233	CLL 36B SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001010	CLL 27 SUR	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001059	CRA 2B	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001058	CRA 2B	Local	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000838 CRA 8		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000890 CRA 8		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000678 CRA 7		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001501 CLL 27A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001564 CLL 27A SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001449 CRA 1 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001777 DIAG 28 BIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001892 DIAG 28 BIS		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4001639 CLL 27 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002840 TV 6 C E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005409 KR 4 BIS E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002749 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002885 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002929 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002958 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4002975 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003016 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003133 TV 6C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4003287 CLL 36H SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005480 DG 46 A S		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4008289 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000262 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007433 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007407 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000324 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000369 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000414 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007422 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	3002085 KR 8 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	3002100 KR 8 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	3002111 KR 8 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	3002116 KR 8 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000444 KR 3 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000459 CL 8 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000463 CL 8 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000486 CRA 5 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000122 CRA 7		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000152 CLL 7 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000299 CRA 2 ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000251 INTERSECCIÓN		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005480 DG 46 A S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000280 CLL 6B SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4006096 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4008452 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4006060 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4006046 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4006032 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4006004 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4008442 CLL 48 SUR		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4008278 CRA 5		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000595 CRA 4		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4000615 CRA 10C ESTE		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005488 KR 4 BIS E		Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4002928 DG 32 C S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4003134 CL 36 H S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4003383 KR 7 E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4003219 KR 6 E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4003237 CL 37 BIS S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007892 CL 37 BIS S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4003201 CL 37 BIS S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000755 KR 7 B		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000577 KR 7 B		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000704 KR 8 A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006379 CL 60A S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006036 CL 54 A BIS A S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000697 KR 8 A		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007644 CL 19 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000748 CL 19 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000763 CL 19 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000774 CL 19 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000779 CL 19 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000827 KR 10 B E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000901 KR 10 B E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000990 KR 10 B E		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001052 CL 21 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001122 CL 21 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007399 CL 21 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007683 CL 21 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000951 CL 21 S		Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000860 CL 21 S		Local	Ejecución física



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000803	CL 21 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001075	CL 22 BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007686	CL 22 BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000920	KR 11 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001042	CL 18 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001006	KR 11 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001027	KR 11 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4004801	KR 9 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005581	CL 43 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005582	CL 43 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005582	TV 11 B E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005878	CL 47 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4001360	CL 21 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000296	KR 7 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4002208	CL 29 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005488	KR 4 BIS E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005561	CL 48 C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005561	CL 48 C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005647	CL 51 BIS A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005647	CL 51 BIS A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4005670	CL 51 A S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005670	CL 51 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006400	KR 15 C E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006400	KR 15 C E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006451	CL 61 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006451	CL 61 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006453	KR 17 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006453	KR 17 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006478	CL 59 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006478	CL 59 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006718	KR 17 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006718	KR 17 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006736	KR 18 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006736	KR 18 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006743	KR 18 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006743	KR 18 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4006746	KR 18 A E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006746	KR 18 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007223	KR 17 BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007223	KR 17 BIS E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007224	CL 43 A BIS S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007224	CL 43 A BIS S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2016	4007300	CL 48 S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007300	CL 48 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007619	KR 13 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007619	KR 13 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007691	TV 12 D E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007691	TV 12 D E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007800	KR 6 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2018	4007800	KR 6 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007927	KR 10 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007927	KR 10 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007971	KR 16 D E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007971	KR 16 D E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	4007972	CL 46 C S	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4007972	CL 46 C S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50000987	TV 12 E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50000987	TV 12 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50005522	KR 8 B BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50005522	KR 8 B BIS E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	50007951	KR 17 A E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	50007951	KR 17 A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2017	<Null>	KR 0 BIS E	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	<Null>	KR 0 BIS E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4000243	CL 6A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4002268	CL 29 S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4004818	KR 16B E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4004958	KR 16B E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006378	CL 60 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005530	KR 15 E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006431	KR 12A E	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4005497	DG 46 A S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4004898	CL 42 B S	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1557-00	Km/carril de malla vial local/rura	2019	4006390	TV 14 C E	Local	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



Tabla No. 13. Territorialización Jardines Infantiles.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Jardín Infantil	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13276826 <Null>		TV 14C E 54 55 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11135809 <Null>		KR 12BBIS E 28H 09 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13276604 <Null>		TV 13D E 58B 21 SUR	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13031124 <Null>		CL 30C S 2B 13	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13544803 <Null>		CL 38A S 2K 25	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11085702 <Null>		KR 12 E 17F 16 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	20134405 <Null>		KR 24C E 18 12 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13152624 <Null>		CL 43A S 12A 37 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13191403 <Null>		CL 43C S 3D 38 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13243220 <Null>		CL 53D S 12 A 10 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11130910 <Null>		CL 24C S 10H 14 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	14060623 <Null>		KR 8 33 19 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13170110 <Null>		CL 44A S 13B 18 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11091402 <Null>		KR 1A 6C 35 S. INT. 8	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13331106 <Null>		KR 10B E 40 20 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13283658 <Null>		CL 52B S 5C 85 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13427233 <Null>		CL 41BIS S 17 15 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11113319 <Null>		CL 11A S 1 71 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	14097102 <Null>		CL 36 S 8 22	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	12051928 <Null>		KR 6 15 47 S	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	12050621 Casita De Los Niños Wawita Kunapa Wasi		CL 18 S 9 40	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13556403 <Null>		CL 37BISB S 2 81 E	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	12101906 <Null>		CL 1 S 7A 24	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13558411 <Null>		CL 37 S 2 00 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13030621 <Null>		CL 27A S 2 75	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13221004 <Null>		KR 15B E 60 43 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13545509 <Null>		CL 37ABIS S 3A 84	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13250613 <Null>		CL 71 S 13B 22 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11082402 <Null>		KR 22BIS E 9A 68 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13304918 <Null>		CL 47 S 01 03	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13276707 <Null>		TV 12 E 55 98 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	14090725 <Null>		CL 35A S 6A 15	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13212705 <Null>		CL 41B S 1 23 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13112402 <Null>		CL 43C S 3 82 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13384232 <Null>		CL 66 S 11A 27 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13057216 <Null>		CL 32A S 3A 91 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13181109 <Null>		KR 16A E 46C 20 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11083501 <Null>		CL 13 S 2 30 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13020525 <Null>		CL 27A S 2 75 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13325105 <Null>		KR 4 E 48C 36 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11164201 <Null>		CL 14 S 23 44 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13087605 <Null>		CL 34H S 7 20 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13140303 <Null>		CL 40BBIS S 11 86 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13153631 <Null>		KR 13BIS E 43A 07 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13270521 <Null>		KR 11 E 55 16 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	12101515 <Null>		KR 7BIS 2 53 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13545919 <Null>		KR 3ABIS 37D 30 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11083930 <Null>		KR 18 E 12 41 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13283758 <Null>		CL 53 SUR S C 75 ESTE	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13057205 <Null>		CL 33A S 3B 61 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11080710 <Null>		CL 17A S 6 84 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13570210 <Null>		KR 4 ESTE 28 74 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	11034405 <Null>		TV 3 E 6D 25 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13380409 <Null>		CL 64 S 10A 10 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13214006 <Null>		KR 1C 41 74 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13213510 <Null>		KR 1 BIS 42 08 SUR	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13157618 <Null>		CL 46F S 12A 33 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13545801 <Null>		KR 3A 37C 15 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13246959 <Null>		CL 48A S 13F 89 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13142301 <Null>		CL 42A S 8 32 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13021448 <Null>		CL 27 S 0 31 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13276826 <Null>		TV 14C E 54 55 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11135809 <Null>		KR 12BBIS E 28H 09 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13276604 <Null>		TV 13D E 58B 21 SUR	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13031124 <Null>		CL 30C S 2B 13	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13544803 <Null>		CL 38A S 2K 25	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11085702 <Null>		KR 12 E 17F 16 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	20134405 <Null>		KR 24C E 18 12 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13152624 <Null>		CL 43A S 12A 37 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13191403 <Null>		CL 43C S 3D 38 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13243220 <Null>		CL 53D S 12 A 10 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11130910 <Null>		CL 24C S 10H 14 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	14060623 <Null>		KR 8 33 19 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13170110 <Null>		CL 44A S 13B 18 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11091402 <Null>		KR 1A 6C 35 S. INT. 8	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13331106 <Null>		KR 10B E 40 20 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13283658 <Null>		CL 52B S 5C 85 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13427233 <Null>		CL 41BIS S 17 15 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11113319 <Null>		CL 11A S 1 71 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	14097102 <Null>		CL 36 S 8 22	Zonal	Ejecución física



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Jardín Infantil	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	12051928 <Null>		KR 6 15 47 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	12050621 Casita De Los Niños Wawita Kunapa Wasi		CL 18 S 9 40	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13556403 <Null>		CL 37BISB S 2 81 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	12101906 <Null>		CL 1 S 7A 24	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13558411 <Null>		CL 37 S 2 00 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13030621 <Null>		CL 27A S 2 75	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13221004 <Null>		KR 15B E 60 43 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13545509 <Null>		CL 37ABIS S 3A 84	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13250613 <Null>		CL 71 S 13B 22 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11082402 <Null>		KR 22BIS E 9A 68 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13304918 <Null>		CL 47 S 01 03	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13276707 <Null>		TV 12 E 55 98 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	14090725 <Null>		CL 35A S 6A 15	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13212705 <Null>		CL 41B S 1 23 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13112402 <Null>		CL 43C S 3 82 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13384232 <Null>		CL 66 S 11A 27 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13057216 <Null>		CL 32A S 3A 91 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13181109 <Null>		KR 16A E 46C 20 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13020525 <Null>		CL 27A S 2 75 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13325105 <Null>		KR 4 E 48C 36 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11164201 <Null>		CL 14 S 23 44 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13087605 <Null>		CL 34H S 7 20 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13140303 <Null>		CL 40BBIS S 11 86 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13153631 <Null>		KR 13BIS E 43A 07 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13270521 <Null>		KR 11 E 55 16 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	12101515 <Null>		KR 7BIS 2 53 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13545919 <Null>		KR 3ABIS 37D 30 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11083930 <Null>		KR 18 E 12 41 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13057205 <Null>		CL 33A S 3B 61 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11080710 <Null>		CL 17A S 6 84 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	11034405 <Null>		TV 3 E 6D 25 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13380409 <Null>		CL 64 S 10A 10 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13214006 <Null>		KR 1C 41 74 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13157618 <Null>		CL 46F S 12A 33 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13545801 <Null>		KR 3A 37C 15 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13246959 <Null>		CL 48A S 13F 89 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13142301 <Null>		CL 42A S 8 32 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13021448 <Null>		CL 27 S 0 31 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1492-00	2017	13030060 <Null>		CL 27A S # 2 49	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2018	13550640 <Null>		CL 37BISB S # 2 81 E	<Null>	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1492-00	2019	14090070 <Null>		CL 35A S # 6A 15	<Null>	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI

Tabla No. 14. Territorialización Salones comunales.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	Nombre Salón	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	CL 46A S # 3B 30 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	CL 48B S # 11 14 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	CL 36C S # 9 28 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	TV 14A E # 43 10 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	CL 41 S # 6B 99 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	KR 6 E # 48C 12 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2017	<Null>	CL 37D S # 6C 81 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	DG 43D S # 16C 14 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	KR 1 # 36H 12 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	CL 46G S # 15 28 E	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	KR 9A E # 30A 10 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	CL 39A S # 5 25	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2018	<Null>	CL 35A S # 7A 10	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	KR 12B E # 37 12 S	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	CL 11 S # 22 60 E	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	CL 32 S # 8 53	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	CL 71 S # 15 84 E	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	CL 36H S # 8 75 E	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	KR 11 E # 40 00 S	Vecinal	Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1578-00	Salones comunales intervenidos	2019	<Null>	KR 1 E # 32 74 S	Vecinal	Ejecución física

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 15. Territorialización Escuelas de Formación Artística.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre IED	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	12052222	<Null>	KR 10 13 52 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13154901	<Null>	CL 42A S 12A 27 E	Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13210201	<Null>	CL 40A S 2 56 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	14061417	<Null>	KR 5A 31 45 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13061213	<Null>	TV 10A E 27 57 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	11120207	<Null>	KR 6 18A 20 S	Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13048401	<Null>	CL 31DBIS S 2 24 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13210115	<Null>	DG 39 S 2 00 E	Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13120714	<Null>	KR 12 E 33A 80 S	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	11080135	<Null>	KR 3 E 18 76 S	Urbana	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13160703	<Null>	CL 42C S 16A 05 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13237201	<Null>	DG 60B S 14A 33 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	11031827	<Null>	CL 7A S 0 50 E (KR 8 E 8C 37 S)	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	11082346	Colegio San Cristóbal Sur	KR 10D E 17B 46 S (KR 12G 22B 11 S)	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	14061001	<Null>	CL 34 S 7A 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	13141204	<Null>	CL 42 S 12A 66 E	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2017	14052513	<Null>	KR 7 24 01 S	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13210201	<Null>	CL 40A S 2 56 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	14061417	<Null>	KR 5A 31 45 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13048401	<Null>	CL 31DBIS S 2 24 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11080135	<Null>	KR 3 E 18 76 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13237201	<Null>	DG 60B S 14A 33 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11031827	<Null>	CL 7A S 0 50 E (KR 8 E 8C 37 S)	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11082346	Colegio San Cristóbal Sur	KR 10D E 17B 46 S (KR 12G 22B 11 S)	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	14052513	<Null>	KR 7 24 01 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11082719	<Null>	KR 12 E 13 42 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	2,01317E+11	<Null>	CL 14 S 22 01 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13195713	<Null>	CL 43B S 10 03 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13030403	<Null>	KR 2A 29A 29 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11010813	<Null>	KR 4 0 43	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13277816	<Null>	KR 15 E 58 04 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13106202	<Null>	KR 3B E 38 25 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	12050730	<Null>	KR 9A 18 74 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13061213	<Null>	TV 10A E 27 57 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11120207	<Null>	KR 6 18A 20 S	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13210115	<Null>	DG 39 S 2 00 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13160703	<Null>	CL 42C S 16A 05 E	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	11083116	<Null>	CARRETERA ORIENTE 14 24. INT 143	Zonal	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1486-00	2018	13380804	<Null>	CL 64 S 10A 39 E	Zonal	Ejecución física

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Lugar	Dirección	Etapas avance
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	14050470	JAC La Serafina	KR 8 # 27B 01 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	13040010	Casa de los Afros	KR 3 # 30A 08 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	14300700	JAC Guacamayas	DG 35 S # 3 11	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	11030560	JAC La Roca	CL 6BBIS S # 5 29 E	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	14050280	Recinto Ferial	DG 30A S # 5A 91	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	13270390	Casa De La Cultura Libertadores	CL 56 S # 14A 19 E	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	13240020	JAC Republica De Canadá	DG 50 S # 12D 25 E	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	12100230	JAC Calvo Sur	KR 7A # 3 24 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	13160060	Iglesia Santarosa	CL 41B S # 16A 15 E	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2017	11180310	Casa El Nido del Búho	KR 23B E # 11B 08 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2018	13250060	Salón Comunal Juan Rey Suroriental	KR 13B E # 70 36 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2018	13330110	Salón Comunal Altos Del Poblado	KR 10A E # 40 01 S	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2018	13040730	Salón Comunal Atenas	CL 34 S # 3A 86 E	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2018	11020380	Salón Comunal Camino Viejo De San Cristobal	CL 6A S # 4 37	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1554-00	2018	13090150	JAC San Vicente Parta Alta	CL 36H S # 8 79 E	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Se evidenció participación masiva en los proyectos deportivos, se contó con el compromiso de los contratistas para la realización de los eventos; sin embargo, hubo falencias en tiempos por temas del IDRD en cuanto a escenarios deportivos y sus prestamos, ya que lamentablemente durante la vigencia desde nivel central se dificultó este ejercicio. Se abrió la expectativa desde la comunidad que pide más olimpiadas comunitarias por su buen desarrollo y ejecución.

Se recomienda proyectar campeonatos de esta magnitud en todas las disciplinas y contar con el apoyo de nivel central del IDRD para estos ejercicios que son aprovechables y tienen buena acogida por parte de la comunidad.

Se realizaron procesos de formación donde la mayor dificultad fue el compromiso de los líderes y algunos niños y niñas para su asistencia; se recuperaron esos espacios deportivos donde se encontraban bandas delincuenciales, consumo de droga y problemas de seguridad, además de sacar a los niños de esos espacios que no son los adecuados para su edad.

Se recomienda realizar seguimiento a los jardines intervenidos, para garantizar el cumplimiento de las pólizas vigentes, que acobijan las intervenciones realizadas durante el cuatrienio.

Pilar 2. Democracia urbana.

Teniendo en cuenta la necesidad de plantear estudios y diseños para la construcción de parques, el cumplimiento de la meta se vio retrasado; no obstante, con la ejecución de la vigencia 2019, la meta del cuatrienio se lleva a término.

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Se evidencia una falta de acción inmediata por parte de la Empresa Aguas de Bogotá frente a las dinámicas sociales y topografías de la localidad, generando retrasos en la intervención de puntos críticos; sin embargo, las acciones sociales y de sensibilización fueron posibles dadas las medidas tomadas desde la administración local.

Se requiere de un mayor compromiso de los habitantes de los sectores intervenidos que han preservado hábitos que no son acordes con las necesidades del territorio; en este sentido, se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



continúa trabajando en coordinación con el operador de aseo Promoambiental en estas áreas, con su equipo social y desde la Alcaldía Local se realizarán jornadas de imposición de comparendos con la Policía en el marco de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de policía.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019

Ver Anexo No 1.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
